

การรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้างสาธารณูปโภค เชื่อมโยงเขตพื้นที่เศรษฐกิจ และรองรับการขยายตัวของเมือง

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนสาธารณะ	700,000 (งบ อบต.)	500,000 (งบ อบต.)	276,000	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	กองช่าง	✓			จ้างเหมารถแบ็คโฮปรับพื้นที่และ ซ่อมแซมถนนสาธารณะ โดยการ ลงหินคลุก กลบหลุม/บ่อ หมู่ที่ 2,3,4,6,7 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568  	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
2	ก่อสร้างหลังคาคลุม (Cover Way) เชื่อมอาคารเรียน ภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลโสธร	450,000 (งบ อบต.)	450,000 (งบ อบต.)	423,000	มกราคม - มีนาคม 2568	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	✓			ก่อสร้างหลังคาคลุม (Cover Way) เชื่อมอาคารเรียน ภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลโสธร อาคารที่ 1 กว้าง 4.25 เมตร ยาว 17.00 เมตร อาคาร ที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568 	-
3	ติดตั้งป้ายจราจร	100,000 (งบ อบต.)	60,000 (งบ อบต.)	-	มีนาคม - พฤษภาคม 2568	กองช่าง			✓	-	เนื่องจากป้าย จราจรที่มีอยู่ เดิม ไม่พบความ ชำรุด เสียหาย มีความเพียงพอ เหมาะสม จึง ดำเนินการใน ปีงบประมาณ ถัดไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
4	ลอกท่อระบายน้ำ	300,000 (งบ อบต.)	200,000 (งบ อบต.)	-	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	กองช่าง			✓	-	เนื่องจาก แรงงานคนใน พื้นที่หายาก และเรือนจำ งดนักโทษออก ดำเนินการ
5	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ถนนสายต่าง ๆ	200,000 (งบ อบต.)	50,000 (งบ อบต.)	31,000	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	กองช่าง	✓			จ้างเหมาปักเสาไฟ พร้อมติดตั้งระบบ ไฟฟ้า บริเวณถนนโสธรซอย ๒/๓ หมู่ที่ ๒ (หลังโรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไทรลิงกวล) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2568	-



ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
6	ก่อสร้างกำแพงกันดิน ริมคลองสาธารณะ	1,000,000 (งบ อบต.)	300,000 (งบ อบต.)	241,900	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	กองช่าง	✓			1. จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน ริมคลองสาธารณะ หลอดதாகก หมู่ที่ 6 งบประมาณ จำนวน 86,000 บาท  2. จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน ริมคลองสาธารณะ หลอดตาปลิว หมู่ที่ 4 งบประมาณ จำนวน 37,700 บาท  3. จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน ริมคลองสาธารณะ หลอดதாகก หมู่ที่ 6 งบประมาณ จำนวน 118,200 บาท 	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
7	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีเจริญ ซอย 2 หมู่ที่ 1	133,000 (งบ อบต.)	133,000 (งบ อบต.)	กันเงิน	มกราคม - เมษายน 2568	กองช่าง		✓		อยู่ระหว่างดำเนินการ - ผู้รับจ้างดำเนินการเข้าแบบบ่อพัก และเทพื้นบ่อพัก 	เนื่องจากโครงการ มีจำนวนมาก ทำให้ดำเนินการ ไม่ทัน ซึ่งปัจจุบัน อยู่ระหว่าง จัดทำโครงการ และได้กันเงิน ไปดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
8	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนโสร้อย ซอย 2/2 หมู่ที่ 2	4,408,000 (งบ อบต.)	4,408,000 (งบ อบต.)	กันเงิน	มกราคม - พฤษภาคม 2568	กองช่าง			✓	-	เนื่องจากโครงการ มีจำนวนมาก ทำให้ดำเนินการ ไม่ทัน ซึ่งปัจจุบัน อยู่ระหว่าง จัดทำโครงการ และได้กันเงิน งบประมาณ ไปดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
9	ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต เป็นถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อม ท่อระบายน้ำ ถนนโสร้อยพัฒนา ซอย 3 และก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนโสร้อยพัฒนา ซอย 3/2 หมู่ที่ 3	2,386,000 (งบ อบต.)	2,386,000 (งบ อบต.)	กันเงิน	มิถุนายน - กันยายน 2568	กองช่าง			✓	-	เนื่องจากโครงการ มีจำนวนมาก ทำให้ดำเนินการ ไม่ทัน ซึ่งปัจจุบัน อยู่ระหว่างจัดทำ โครงการและ ได้กันเงิน งบประมาณ ไปดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
10	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนโสรธรพัฒนา หมู่ที่ 4	1,420,000 (งบ อบต.)	1,420,000 (งบ อบต.)	กันเงิน	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2568	กองช่าง			✓	-	เนื่องจากโครงการ มีจำนวนมาก ทำให้ดำเนินการ ไม่ทัน ซึ่งปัจจุบัน อยู่ระหว่างจัดทำ โครงการและ ได้กันเงิน ไปดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนโสร พัฒนา ซอย 9/1 หมู่ที่ 4	140,000 (งบ อบต.)	140,000 (งบ อบต.)	133,100	มกราคม - มีนาคม 2568	กองช่าง	✓			ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ผิวจราจรรวมบ่อพัก กว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 64.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่ น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568	-



ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
12	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโสรวงแหวน ซอย 7/1 หมู่ที่ 5	339,000 (งบ อบต.)	339,000 (งบ อบต.)	308,900	กุ่มภาพันธุ์ - เมษายน 2568	กองช่าง	✓			ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 82.00 เมตร หรือมี พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 410.00 ตาราง เมตร แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2568  	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
13	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนซอยดวงดี ซอย 3/1 หมู่ที่ 6	842,000 (งบ อบต.)	842,000 (งบ อบต.)	กันเงิน	กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2568	กองช่าง			✓	-	เนื่องจากโครงการ มีจำนวนมาก ทำให้ดำเนินการ ไม่ทัน ซึ่งปัจจุบัน อยู่ระหว่างจัดทำ โครงการและ ได้กันเงิน งบประมาณ ไปดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
14	ปรับปรุงผิวจราจร ถนนแอสฟัลท์คอนกรีต เป็นถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ถนนโศธร ซอย 1 หมู่ที่ 2,7	438,000 (งบ อบต.)	438,000 (งบ อบต.)	กันเงิน	มีนาคม - พฤษภาคม 2568	กองช่าง			✓	-	เนื่องจากโครงการ มีจำนวนมาก ทำให้ดำเนินการ ไม่ทัน ซึ่งปัจจุบัน อยู่ระหว่างจัดทำ โครงการและ ได้กันเงิน งบประมาณ ไปดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
รวม		12,856,000	11,666,000	1,413,900							
รวมแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา		12,856,000	11,666,000	1,413,900							



1.1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	กำจัดวัชพืช ริมถนนสาธารณะ หมู่ที่ 1 - 7	250,000 (งบ อบต.)	200,000 (งบ อบต.)	-	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	กองช่าง	✓			อบต.โสธร ดำเนินการเอง ร่วมกับ จิตอาสาในพื้นที่ โดยไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณตามโครงการฯ โดย ดำเนินการกำจัดวัชพืช ริมถนน สาธารณะในพื้นที่ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2568   	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
2	ขยายเขตประปา สาธารณะ ถนนโสธร วงแหวน ซอย 17 หมู่ที่ 1	23,350 (งบอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	23,350 (งบอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	77,595.83 (โอนเพิ่ม)	พฤศจิกายน 2567 - มกราคม 2568	กองช่าง	✓			เบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุน สำหรับ โครงการขยายเขตประปา ถนนโสธร วงแหวน ซอย 17 (สุขทวี) หมู่ที่ 1 ระยะทาง 46.00 เมตร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2567	-
3	ขยายเขตประปา สาธารณะ ถนนโสธร วงแหวน ซอย 15 หมู่ที่ 1	78,660 (งบอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	78,660 (งบอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	132,617.84 (โอนเพิ่ม)	พฤศจิกายน 2567 - มกราคม 2568	กองช่าง	✓			เบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุน สำหรับ โครงการขยายเขตประปา ถนนโสธร วงแหวน ซอย 15 (ซอยสวนเจ็ก) หมู่ที่ 1 ระยะทาง 154.00 เมตร เรียบร้อย แล้ว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2567	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
4	ขยายเขตประปา สาธารณะ ถนนโสร พัฒนา ซอย 1/1 หมู่ที่ 3	68,000 (งบอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	68,000 (งบอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	120,029 (โอนเพิ่ม)	พฤศจิกายน 2567 - มกราคม 2568	กองช่าง	✓			เบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุน สำหรับ โครงการขยายเขตประปาสาธารณะ ถนนโสรพัฒนา ซอย 1/1 หมู่ที่ 3 (บ้านพ็อย) ระยะทาง 134.00 เมตร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2567	-
5	ขยายเขตประปา สาธารณะ ถนนโสร พัฒนา ซอย 3/2 หมู่ที่ 3	25,380 (งบอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	25,380 (งบอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	-	กุมภาพันธ์ - เมษายน 2568	กองช่าง			✓	-	เนื่องจากโครงการ มีจำนวนมาก ทำให้ดำเนินการ ไม่ทัน จึงเลื่อน ไปดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
6	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ หมู่ที่ 3	500,000 (งบอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	500,000 (งบอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	494,906.74	มีนาคม - พฤษภาคม 2568	กองช่าง	✓			เบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุน สำหรับ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568	-
7	ขยายเขตประปา สาธารณะ ถนนโสร พัฒนา ซอย 9/1 หมู่ที่ 4	25,380 (งบอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	25,380 (งบอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	-	มีนาคม - พฤษภาคม 2568	กองช่าง			✓	-	เนื่องจาก โครงการ มีจำนวนมาก ทำให้ดำเนินการ ไม่ทัน จึงเลื่อน ไปดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
8	ขยายเขตประปา สาธารณะ ถนนโสธร เจริญ ซอย 1 หมู่ที่ 6	187,770 (งบอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	187,770 (งบอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ)	198,191.59 (โอนเพิ่ม)	พฤศจิกายน 2567 - มกราคม 2568	กองช่าง	✓			เบิกจ่ายเป็นเงินอุดหนุน สำหรับ โครงการขยายเขตประปา ถนนโสธร เจริญ ซอย 1 (ซอยก้านเนื่อง) ระยะทาง 297.00 เมตร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2567	-
รวม		1,158,540	1,108,540	1,023,341							
รวมแผนงาน เคหะและชุมชน		1,158,540	1,108,540	1,023,341							

1.1.3 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	กำจัดวัชพืชแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 - 7	200,000 (งบ อบต.)	200,000 (งบ อบต.)	-	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	กองช่าง	✓			อบต.โสธร ดำเนินการเอง ร่วมกับ จิตอาสาในพื้นที่ โดยไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณตามโครงการฯ โดย ดำเนินการกำจัดวัชพืชแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตร ในคลอง/หอดต่างๆ ใน พื้นที่ ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 	-
รวม		200,000	200,000	-							
รวมแผนงานการเกษตร		200,000	200,000	-							

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.1 กลยุทธ์ การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

2.1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาฯ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติฯ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	กรอบของแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
1	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ/ทบทวนองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร	210,000 (งบ อบต.)	209,800 (งบ อบต.)	-	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	สำนักปลัด			✓	-	เนื่องจากยังไม่มีแนวทางการทบทวนที่ชัดเจน
2	ฝึกอบรมซ้ำชี้ปลอดภัย ห่วงไกลอุบัติเหตุ ทุกเทศกาล	25,000 (งบ อบต.)	25,000 (งบ อบต.)	23,552	ธันวาคม 2567 - มีนาคม 2568	สำนักปลัด	✓			จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้ขับขี่รถใช้ถนนทั้งถนนสายหลัก และสายรองในเขตพื้นที่ตำบลโสธร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567  	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
3	ป้องกัน แก้ไขปัญหา การประทุษร้าย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน (ติดตั้งกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด CCTV)	423,730 (งบ อบต.)	423,730 (งบ อบต.)	423,679	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	สำนักปลัด	✓			ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณ จุดเสี่ยงในพื้นที่ตำบลโศธร หมู่ที่ 1 จำนวน 3 จุด และ หมู่ที่ 6 จำนวน 8 จุด รวม 13 จุด แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2568  	-
4	ฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง รุ่นที่ 1	500,000 (งบ อบต.)	213,130 (งบ อบต.)	-	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	สำนักปลัด			✓	-	เนื่องจากจำนวน เป้าหมายไม่ครบ ตามโครงการฯ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
5	ฝึกอบรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหาร ส่วนตำบลโสธร	35,000 (งบ อบต.)	35,000 (งบ อบต.)	33,477	เมษายน - กันยายน 2568	สำนักปลัด	✓			ฝึกอบรมให้ความรู้ และสาธิตวิธีการใช้ เครื่องมือดับเพลิงเบื้องต้น ให้กับ พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้าง/ สมาชิกสภา/กำนัน/สารวัตรกำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และเยาวชนในตำบลโสธร เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2568   	-
	รวม	1,193,730	906,660	480,708							

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.2 กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดช่วงวัย ในด้านการศึกษาและสาธารณสุข และการจัดการโรคอุบัติใหม่


2.2.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ฟื้นฟู เยียวยา และ บรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนที่เกิด จากภัยและสาธารณภัย ต่าง ๆ	200,000 (งบ อบต.)	200,000 (งบ อบต.)	-	กรกฎาคม - กันยายน 2568	สำนักปลัด			✓	-	เนื่องจากเป็นการตั้ง งบประมาณเพื่อ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน เบื้องต้น โดยฉับพลัน ทันที ในด้านการดำรงชีพ การบรรเทาความ เดือดร้อนเฉพาะหน้า และในพื้นที่ที่ยังไม่มี ประชาชนได้รับความ เดือดร้อนที่เกิดจากภัย หรือสาธารณภัยต่าง ๆ
รวม		200,000	200,000	-							
รวมแผนงาน การรักษาความสงบภายใน		1,393,730	1,106,660	480,708							

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

3.1 กลยุทธ์ พัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายพลเมืองผู้นุรักษ์สิ่งแวดล้อม เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.)

3.1.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	พัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก (อถล.) ตำบลโสธร	500,000 (งบ อบต.)	420,000 (งบ อบต.)	344,030	ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	✓			จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ และ ศึกษาดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก (อถล.) ณ จังหวัดกาญจนบุรี และ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2567   	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
2	กิจกรรม สาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาชุมชน ตำบลโสธร	100,000 (งบ อบต.)	100,000 (งบ อบต.)	77,182	ไตรมาสละ 1 ครั้ง จำนวน 4 ไตรมาส - ธันวาคม 2567 - มีนาคม 2568 - มิถุนายน 2568 - กันยายน 2568	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	✓			จัดการประชุมเครือข่าย ออถ. และ ประชาชน ตำบลโสธร และร่วมกันทำ กิจกรรมสาธารณะ จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ ไตรมาสที่ 1 วันที่ 13 ธันวาคม 2567 จัดกิจกรรมการเพาะชำต้นทองนพเก้า เก็บขยะริมถนนสาธารณะ   	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
										ไตรมาสที่ 2 วันที่ 5 มีนาคม 2568 กิจกรรม “LVE Week เครือข่าย อถล. ร่วมใจ ขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมไทย ยั่งยืน” เพื่อรณรงค์และส่งเสริม การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ณ วัดโสธรวราราม วรวิหาร   	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
										และวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2568 อบต. ไสธร์ ได้จัดกิจกรรม CSR "50 ปี ไทย - จีน สานสัมพันธ์สร้างชุมชนสีเขียว" โดยความร่วมมือระหว่าง อบต. ไสธร์ และสมาคมสื่อมวลชนไทย-จีน โดยมีกิจกรรมพัฒนาชุมชน ต.ไสธร์ และการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ออถ. ตำบลไสธร์   	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
										ไตรมาสที่ 3 วันที่ 5 มิถุนายน 2568 โดยจัดกิจกรรม ตัดแต่งกิ่งไม้ริมทาง สาธารณะ เก็บขยะ และปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก   	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
										ไตรมาสที่ 4 วันที่ 2 กันยายน 2568 โดยมีกิจกรรมการรักษาความสะอาดริมคลอง การกำจัดวัชพืช (ผักตบชวา) ในคลองบางพระ กิจกรรมการตัดแต่งกิ่งไม้ริมทางสาธารณะ เก็บขยะริมทางสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และรอบถนนโสธรวงแหวน ตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา  	-
รวม		600,000	520,000	421,212							
รวมแผนงานสาธารณสุข		600,000	520,000	421,212							

3.1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	จัดเก็บขยะ และสิ่งปฏิกูล	3,400,000 (งบ อบต.)	1,440,000 (งบ อบต.)	1,406,622	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	✓			ดำเนินการจัดเก็บขยะจากครัวเรือน และสถานประกอบการ หมู่ที่ 1-7 นำไปกำจัด ณ สถานที่กำจัดขยะ	-
รวม		3,400,000	1,440,000	1,406,622							
รวมแผนงาน เคหะและชุมชน		3,400,000	1,440,000	1,406,622							

3.1.3 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	40,000 (งบ อบต.)	40,000 (งบ อบต.)	20,690	พฤษภาคม - กันยายน 2568	กองช่าง	✓			ดำเนินการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ริมทาง สาธารณะ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2568 	-
รวม		40,000	40,000	20,690							
รวมแผนงานการเกษตร		40,000	40,000	20,690							

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพ ทักษะฝีมือแรงงาน เพิ่มผลิตภาพแรงงาน และการบริหารจัดการด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพ

4.1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ฝึกอบรมอาชีพเสริม	100,000 (งบ อบต.)	100,000 (งบ อบต.)	-	มกราคม - สิงหาคม 2568	กอง สวัสดิการ สังคม			✓	-	เนื่องจาก ศกร. ตำบลโสธร ได้ จัดฝึกอบรม อาชีพให้กับ กลุ่มเป้าหมาย โดยครอบคลุม ทุกหมู่บ้านแล้ว
2	ส่งเสริมกิจกรรมสภา เด็กและเยาวชน "อาสาทำดีเพื่อพัฒนา ชุมชนและสังคม"	15,000 (งบ อบต.)	15,000 (งบ อบต.)	-	พฤษภาคม 2568	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม			✓	-	

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
3	กิจกรรมเชิดชูเกียรติ ประชาชน ผู้มีจิตสาธารณะ "จิตอาสาตำบลโสธร"	5,000 (งบ อบต.)	5,000 (งบ อบต.)	3,220	สิงหาคม 2568	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	✓			มอบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเชิดชูเกียรติ ประชาชนในพื้นที่ตำบลโสธร ที่มี จิตสาธารณะ หมู่ที่ 1-7 จำนวน 14 ราย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568 	-
4	พ่อ - แม่ดีเด่น	12,500 (งบ อบต.)	12,500 (งบ อบต.)	2,150	กรกฎาคม - สิงหาคม 2568	กอง สวัสดิการ สังคม	✓			จัดกิจกรรม มอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่พ่อ แม่ ดีเด่น ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโสธร จำนวน 6 ราย เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 	-
รวม		132,500	132,500	5,370							
รวมแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน		132,500	132,500	5,370							

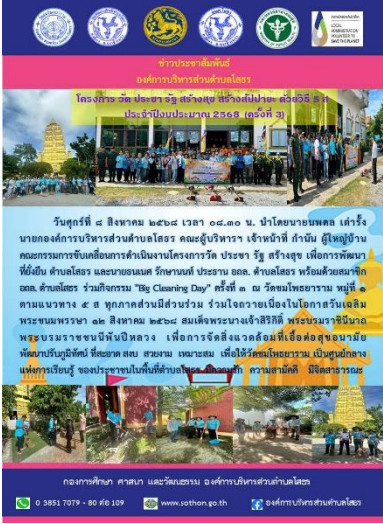
4.1.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	แข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด "เด็ก เยาวชน และ ประชาชนตำบลโสธร"	150,000 (งบ อบต.)	150,000 (งบ อบต.)	85,082	มีนาคม - พฤษภาคม 2568	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	✓			ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ประเภทต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในตำบล หันมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่พึ่งพายาเสพติด เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2568    	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
2	กิจกรรมวันสำคัญ ทางพุทธศาสนา เนื่อง ในวัน "อาสาฬหบูชา" และวัน "เข้าพรรษา"	30,000 (งบ อบต.)	30,000 (งบ อบต.)	7,728	กรกฎาคม 2568	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	✓			ดำเนินการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา และ ถวายต้นเทียน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2568 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้จัดกิจกรรม ถวายต้นเทียนและเครื่องไทยธรรม ณ ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2568  	-

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาฯ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติฯ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	กรอบของแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
3	ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	50,000 (งบ อบต.)	50,000 (งบ อบต.)	4,722	เมษายน 2568	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	✓			จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2568 	-
4	ส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่น	25,000 (งบ อบต.)	25,000 (งบ อบต.)	9,772	เมษายน - พฤษภาคม 2568	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	✓			สนับสนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่น "ทำบุญขวัญทุ่ง ตำบลโสธร" เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
5	วัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะ ด้วยวิธี 5 ส	15,000 (งบ อบต.)	15,000 (งบ อบต.)	12,032	จัดกิจกรรม จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ - พฤศจิกายน 2567 - กุมภาพันธ์ 2568 - สิงหาคม 2568 - กันยายน 2568	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	✓			จัดกิจกรรมพัฒนาวัดในพื้นที่ให้มีความ เป็นระเบียบ มีมาตรฐานตามแนวทาง 5 ส จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567  ครั้งที่ 2 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2568  	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
										ครั้งที่ 3 วันที่ 8 สิงหาคม 2568  ครั้งที่ 4 วันที่ 12 กันยายน 2568 	-

ที่	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาฯ	งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติฯ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	กรอบของแผนการดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
6	สืบสานงานประเพณีท้องถิ่น/ท้องถิ่นวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา	30,000 (งบ อบต.)	30,000 (งบ อบต.)	12,000	เมษายน 2568	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	✓			ร่วมจัดกิจกรรมตั้งโต๊ะหมู่บูชา ถวายพุทธบูชาหลวงพ่พุทธรโสธร ณ บริเวณด้านหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามเส้นทางขบวนแห่องค์หลวงพ่พุทธรโสธรทางบก เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567  	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
7	สืบสานงานประเพณี อัญเชิญหลวงพ่อโสธร ขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง	30,000 (งบ อบต.)	30,000 (งบ อบต.)	ไม่ได้ เบิกจ่าย งบประมาณ	เมษายน 2568	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	√			ร่วมงานประเพณีพิธีอัญเชิญหลวงพ่อ โสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ในพิธีรำ ถวายเป็นพุทธบูชา อัญเชิญหลวงพ่อ โสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ณ บริเวณ หน้าพระอุโบสถ วัดโสธรวราราม วรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 	-
รวม		330,000	330,000	131,336							
รวมแผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ		330,000	330,000	131,336							

4.2 กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดช่วงวัย ในด้านการศึกษา และสาธารณสุขและการจัดการโรคอุบัติใหม่

4.2.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	สนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	550,000 (งบ อบต./ เงินอุดหนุน)	302,425 (งบ อบต./ เงินอุดหนุน)	180,234	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	✓			ดำเนินการจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวันสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลโสธร	-
	1.1 ค่าโภชนาการอิม ท้อง สมองดี (อาหาร กลางวัน)		220,500	146,808							

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
	1.2 ค่าสื่อการสอน เสริมสร้างพัฒนาการ (ค่าจัดการเรียนการ สอนรายหัว) สำหรับ เด็กปฐมวัย		49,300	25,636			✓				-
	1.3 ค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กปฐมวัย		5,000	1,200			✓				-
	1.4 ค่าอุปกรณ์ การเรียน สำหรับเด็ก ปฐมวัย		7,250	1,740			✓			ยืมเงินงบประมาณ จ่ายเป็นเงินสดให้กับ ผู้ปกครอง	-
	1.5 ค่าเครื่องแบบ นักเรียน สำหรับเด็ก ปฐมวัย		8,125	1,950			✓			ยืมเงินงบประมาณ จ่ายเป็นเงินสดให้กับ ผู้ปกครอง	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
	1.6 ค่าจัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน สำหรับ เด็กปฐมวัย		12,250	2,900			√			ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา ผู้เรียนที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ ทั้ง 4 ด้าน ที่เหมาะสมตามวัย ณ บ้าน น้ำเลนคาเฟ่ มินิซู แอนด์ โฮมสเตย์ ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2568 	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
2	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	90,000 (งบ อบต./ เงินอุดหนุน)	52,845 (งบ อบต./ เงินอุดหนุน)	40,420.90	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	✓			ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กเล็ก จำนวน 260 วัน ครบ ตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2568 	-
3	กิจกรรมวันพ่อ	5,000 (งบ อบต.)	5,000 (งบ อบต.)	ไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	ธันวาคม 2567	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	✓			ดำเนินการจัดกิจกรรมใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง กิจกรรมกราบพ่อ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567  	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
4	กิจกรรมวันแม่	5,000 (งบ อบต.)	5,000 (งบ อบต.)	5,000	สิงหาคม 2568	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	√			จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กิจกรรม เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็ก และผู้ปกครองโดยให้เด็กกราบแม่ ด้วยพวงมาลัยดอกมะลิ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568	-



ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
5	กิจกรรมวันเด็ก	100,000 (งบ อบต.)	100,000 (งบ อบต.)	53,375	มกราคม 2568	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	√			จัดกิจกรรมวันเด็กและจัดการแข่งขัน เล่นเกมสำหรับเด็กเรียนรู้ที่เสริมสร้าง ทักษะความรู้ความสนุกสนานและการ แสดงความสามารถของเด็กและ เยาวชนในพื้นที่ตำบลโสธร และพื้นที่ ใกล้เคียง เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2568   	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
6	ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,500 (งบ อบต.)	3,500 (งบ อบต.)	ไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	สิงหาคม 2568	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	✓			จัดกิจกรรมนำเด็กปฐมวัยออกไป ทัศนศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ ณ วัดบางปรังโชติการาม ตำบลบางพระ และวัดชมโพธาราม ตำบลโสธร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568	-
											

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
9	ฝึกอบรบเด็ก ปลอดภัย ไม่ติดในรถยนต์	6,000 (งบ อบต.)	6,000 (งบ อบต.)	360	กันยายน 2568	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	✓			ดำเนินการจัดฝึกอบรบ/ กิจกรรมให้ความรู้แก่เด็กปฐมวัย ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตัวเอง และช่วยเหลือเด็กในเบื้องต้นได้ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 	-
รวม		795,850	511,120	286,649.90							
รวมแผนงานการศึกษา		795,850	511,120	286,649.90							

4.2 กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดช่วงวัย ในด้านการศึกษา และสาธารณสุขและการจัดการโรคอุบัติใหม่

4.2.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	รณรงค์ส่งเสริม การใช้น้ำหมักชีวภาพ	20,000 (งบ อบต.)	20,000 (งบ อบต.)	-	พฤษภาคม - กันยายน 2568	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม			✓	-	เนื่องจากมี ภารกิจเป็น จำนวนมาก จึงดำเนินการ ไม่ทันใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
2	อบรมและรณรงค์ การคัดแยก และ บริหารจัดการขยะ เปียกในชุมชน	20,000 (งบ อบต.)	20,000 (งบ อบต.)	-	มิถุนายน - กันยายน 2568	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม			✓	-	เนื่องจากมี ภารกิจเป็น จำนวนมาก จึงดำเนินการ ไม่ทันใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
3	ควบคุมโรค ขาดสารไอโอดีน	49,000 (เงินอุดหนุนฯ)	49,000 (เงินอุดหนุนฯ)	-	มกราคม – เมษายน 2568	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม			✓	-	มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนฯ เป็น อุดหนุนให้ หมู่บ้าน ดำเนินการเอง แล้วเสร็จ
4	ควบคุมโรค หนองพยาธิ	49,000 (เงินอุดหนุนฯ)	49,000 (เงินอุดหนุนฯ)	-	กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2568	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม			✓	-	การแก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนฯ เป็น อุดหนุนให้ หมู่บ้าน ดำเนินการเอง แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
5	ตรวจสอบสภาพเคลื่อนที่	42,000 (เงินอุดหนุนฯ)	42,000 (เงินอุดหนุนฯ)	-	ธันวาคม 2567 - มีนาคม 2568	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม			✓	-	การแก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนฯ เป็น อุดหนุนให้ หมู่บ้าน ดำเนินการเอง แล้วเสร็จ
6	อบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1	20,000 (เงินอุดหนุนฯ)	20,000 (เงินอุดหนุนฯ)	20,000	มกราคม - กันยายน 2568	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	✓			ดำเนินการจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568	-
7	อบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 2	20,000 (เงินอุดหนุนฯ)	20,000 (เงินอุดหนุนฯ)	20,000	มกราคม - กันยายน 2568	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	✓			ดำเนินการจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 2 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
8	อบรรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 3	20,000 (เงินอุดหนุนฯ)	20,000 (เงินอุดหนุนฯ)	20,000	มกราคม - กันยายน 2568	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	✓			ดำเนินการจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตามโครงการอบรรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 3 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568	-
9	อบรรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 4	20,000 (เงินอุดหนุนฯ)	20,000 (เงินอุดหนุนฯ)	20,000	มกราคม - กันยายน 2568	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	✓			ดำเนินการจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตามโครงการอบรรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 4 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568	-
10	อบรรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 5	20,000 (เงินอุดหนุนฯ)	20,000 (เงินอุดหนุนฯ)	20,000	มกราคม - กันยายน 2568	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	✓			ดำเนินการจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตามโครงการอบรรมหมอบ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 5 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
11	อบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 6	20,000 (เงินอุดหนุนฯ)	20,000 (เงินอุดหนุนฯ)	20,000	มกราคม - กันยายน 2568	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	✓			ดำเนินการจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตามโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 6 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568	-
12	พัฒนา รักษา ความสะอาด อนามัยดี ปราศจากโรค ชุมชน บ้านปากคลอง (ระบบ สุขาภิบาล ของชุมชน บ้านปากคลอง) หมู่ที่ 7	20,000 (เงินอุดหนุนฯ)	20,000 (เงินอุดหนุนฯ)	20,000	มกราคม - กันยายน 2568	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	✓			ดำเนินการจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตามโครงการพัฒนา รักษาความ สะอาดอนามัยดี ปราศจากโรค ชุมชน บ้านปากคลอง (ระบบสุขาภิบาล ของชุมชนบ้านปากคลอง) หมู่ที่ 7 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568	-
รวม		320,000	320,000	120,000							
รวมแผนงานสาธารณสุข		320,000	320,000	120,000							

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

5.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย และพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะแห่ง EEC ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

5.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของทาง ราชการ	200,000 (งบ อบต.)	180,000 (งบ อบต.)	-	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	สำนักปลัด	✓			ดำเนินการจัดทำปฏิทิน เพื่อเผยแพร่ ผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายเพื่อ ให้ได้มาซึ่งบริการ	-
2	ส่งเสริมการประหยัด พลังงานและการใช้ พลังงานทดแทน (ติดตั้ง ระบบผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์บน หลังคา Solar Rooftop)	974,000 (งบ อบต.)	974,000 (งบ อบต.)	กันเงิน	มกราคม - สิงหาคม 2568	สำนักปลัด			✓	-	
รวม		1,174,000	1,154,000	-							
รวมแผนงานบริหารงาน ทั่วไป		1,174,000	1,154,000	-							



ครุภัณฑ์



1. ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้างสาธารณูปโภค เชื่อมโยงเขตพื้นที่เศรษฐกิจ และรองรับการขยายตัวของเมือง

1.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น แบบ 2 ก๊อก	15,000 (งบ อบต.)	15,000 (งบ อบต.)	-	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	สำนักปลัด			✓	-	เนื่องจาก ครุภัณฑ์เดิม ยังสามารถ ใช้งานได้

1. ประเภท ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้างสาธารณูปโภค เชื่อมโยงเขตพื้นที่เศรษฐกิจ และรองรับการขยายตัวของเมือง

1.1.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	28,500 (งบ อบต.)	28,500 (งบ อบต.)	28,500	ตุลาคม - ธันวาคม 2567	กองช่าง	✓			ดำเนินการจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบ ข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 	-

2. ประเภท ครุภัณฑ์การเกษตร

2.1 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้างสาธารณูปโภค เชื่อมโยงเขตพื้นที่เศรษฐกิจ และรองรับการขยายตัวของเมือง

2.1.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เลื่อยโซยนต์	10,000 (งบ อบต.)	10,000 (งบ อบต.)	8,300	ตุลาคม - ธันวาคม 2567	กองช่าง	✓			ดำเนินการจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาดบาร์ 11.5 นิ้วจำนวน 1 เครื่อง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2568 	-

3. ประเภท ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

3.1 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้างสาธารณูปโภค เชื่อมโยงเขตพื้นที่เศรษฐกิจ และรองรับการขยายตัวของเมือง

3.1.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เครื่องเจาะดิน	11,100 (งบ อบต.)	11,100 (งบ อบต.)	11,100	ตุลาคม - ธันวาคม 2567	กองช่าง	✓			ดำเนินการจัดซื้อเครื่องเจาะดิน เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ พร้อมดอก เจาะดิน 4 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เรียบร้อย แล้ว เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2568 	-

4. ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

4.1 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย และพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะแห่ง EEC ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

4.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	300,000 (งบ อบต.)	300,000 (งบ อบต.)	299,000	กุมภาพันธ์ - เมษายน 2568	สำนักปลัด	✓			ดำเนินการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ไฟเบอร์กลาส พระบรมฉายาลักษณ์ 3 พระองค์ พร้อมตราสัญลักษณ์ พานพุ่มเงิน พุ่มทอง และป้ายชื่อ หน่วยงาน ฐานไฟเบอร์กลาส ขนาดสูง ไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร ด้านหน้ายาว ไม่น้อยกว่า 8.00 เมตร ความสูงรวม ไม่น้อยกว่า 5.60 เมตร แล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 28 เมษายน 2568 	-

โครงการ ที่ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ



1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

1.1 กลยุทธ์ ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย และพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะแห่ง EEC ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

1.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	-	268,310 (งบ อบต.)	264,630	ธันวาคม 2567 - กรกฎาคม 2568	สำนักปลัด	✓			จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จังหวัดชลบุรี เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2568  	-
รวม		-	268,310	264,630							
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป		-	268,310	264,630							

ครุภัณฑ์ ที่ไม่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ



1. ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้างสาธารณูปโภค เชื่อมโยงเขตพื้นที่เศรษฐกิจ และรองรับการขยายตัวของเมือง

1.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 26,000 บีทียู	-	36,300 (งบ อบต.)	36,000	มกราคม - มีนาคม 2568	สำนักปลัด	✓			ดำเนินการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 26000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ห้องสำนักปลัด จำนวน 1 เครื่อง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2568 	-
2	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)	-	27,900 (งบ อบต.)	27,000	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2568	สำนักปลัด	✓			ดำเนินการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 18000 บีทียู พร้อม ติดตั้ง ห้องทำงานนายกฯ จำนวน 1 เครื่อง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568 	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
3	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง	-	43,000 (งบ อบต.)	43,000	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2568	สำนักปลัด	✓			ดำเนินการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ห้องควบคุม ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง เรียบร้อย แล้ว เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2568 	-
4	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	-	6,600 (งบ อบต.)	5,500	มกราคม - มีนาคม 2568	กองคลัง	✓			ดำเนินการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568 	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
5	เครื่องสแกน ลายนิ้วมือชนิดบันทึก เวลาเข้าออกงาน	-	8,000 (งบ อบต.)	8,000	กุมภาพันธ์ - เมษายน 2568	สำนักปลัด	✓			ดำเนินการจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน จำนวน 1 เครื่อง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2568 	-
6	โต๊ะทำงานหลัก พร้อมกระจก 4 ฟุต	-	5,500 (งบ อบต.)	5,500	กรกฎาคม - กันยายน 2568	กองคลัง	✓			ดำเนินการจัดซื้อโต๊ะทำงานหลัก พร้อม กระจก 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว เรียบร้อย แล้ว เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568 	-

1.1.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เก้าอี้สำนักงาน	-	2,500 (งบ อบต.)	2,200	มกราคม - มีนาคม 2568	กอง การศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม	✓			ดำเนินการ จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน มีพนักพิงและที่นั่งบุฟองน้ำ หุ้มหนังสีดำ มีที่วางแขน 2 ข้างโครงขาแบบเหล็ก 5 แฉก และปรับระดับได้ จำนวน 1 ตัว เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567	-

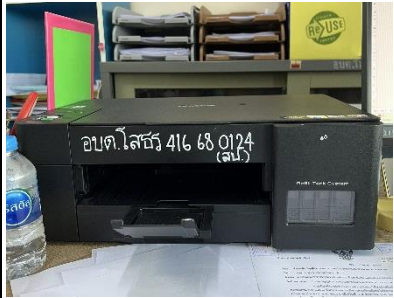
1.1.3 แผนงานสาธารณสุข


ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	-	13,200 (งบ อบต.)	11,000	มกราคม - มีนาคม 2568	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	✓			ดำเนินการจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2567	-
											

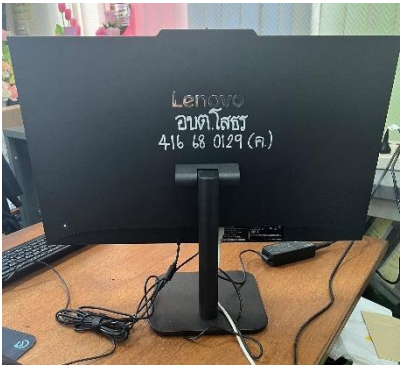
2. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

2.1 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้างสาธารณูปโภค เชื่อมโยงเขตพื้นที่เศรษฐกิจ และรองรับการขยายตัวของเมือง

2.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	-	40,000 (งบ อบต.)	38,400	มกราคม - มีนาคม 2568	สำนักปลัด	✓			ดำเนินการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 	-
2	เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก พร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	-	4,100 (งบ อบต.)	3,990	มกราคม - มีนาคม 2568	สำนักปลัด	✓			ดำเนินการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	-	24,000 (งบ อบต.)	22,900	พฤษภาคม - กรกฎาคม 2568	สำนักปลัด	✓			ดำเนินการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2568 	-
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	-	24,000 (งบ อบต.)	23,200	มกราคม - มีนาคม 2568	กองคลัง	✓			ดำเนินการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
5	เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก พร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	-	4,100 (งบ อบต.)	3,990	มกราคม - มีนาคม 2568	กองคลัง	✓			ดำเนินการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 	-
6	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	-)	20,000 (งบ อบต.)	19,590	กรกฎาคม - กันยายน 2568	กองคลัง	✓			ดำเนินการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่องเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568 	-


ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
7	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000 (งบ อบต.)	8,000 (งบ อบต.)	7,990	กรกฎาคม - กันยายน 2568	กองคลัง	✓			ดำเนินการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2568	-
											

2. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

2.1 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้างสาธารณูปโภค เชื่อมโยงเขตพื้นที่เศรษฐกิจ และรองรับการขยายตัวของเมือง

2.1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

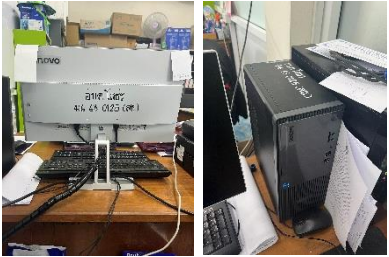
ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 2	32,000 (งบ อบต.)	32,000 (งบ อบต.)	31,500	มกราคม - มีนาคม 2568	กองช่าง	✓			ดำเนินการ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568	-



2. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

2.1 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้างสาธารณูปโภค เชื่อมโยงเขตพื้นที่เศรษฐกิจ และรองรับการขยายตัวของเมือง

2.1.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	-	20,000 (งบ อบต.)	19,990	มกราคม - มีนาคม 2568	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	✓			จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน(จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เรียบร้อย แล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 	-
2	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000 (งบ อบต.)	8,000 (งบ อบต.)	7,990	มกราคม - มีนาคม 2568	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม	✓			จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 	-

6. ประเภท ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

6.1 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้างสาธารณูปโภค เชื่อมโยงเขตพื้นที่เศรษฐกิจ และรองรับการขยายตัวของเมือง

6.1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เครื่องพิมพ์แบบฉีด หมึก พร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์(Ink Tank Printer)	4,100 (งบ อบต.)	4,100 (งบ อบต.)	3,990	พฤษภาคม - สิงหาคม 2568	กองช่าง	✓			ดำเนินการ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบ ฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 	-

**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
กรณีกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567)**



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้างสาธารณูปโภค เชื่อมโยงเขตพื้นที่เศรษฐกิจ และรองรับการขยายตัวของเมือง

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบาย น้ำ ถนนโศธรพัฒนา หมู่ที่ 3	4,750,000 (งบ อบต.)	4,750,000 (งบ อบต.)	4,621,613	ตุลาคม 2567 - มกราคม 2568	กองช่าง	✓			ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมขยายผิวจราจร วางท่อ ระบายน้ำ ถนนโศธรพัฒนา หมู่ที่ 3 (หน้าหมู่บ้านพฤษภา) โดยปรับปรุงผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ่อพัก และรางวี กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง ยาว 475.00 เมตร หรือ มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,850.00 ตารางเมตร และก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร , 0.60 เมตร พร้อมก่อสร้างบ่อพักท่อ ระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร , 0.60 เมตร แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
2	ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต เป็นผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโศธรวงแหวน ซอย 13 หมู่ที่ 5	418,079.53 (งบ อบต.)	418,079.53 (งบ อบต.)	418,079.53	ตุลาคม - ธันวาคม 2567	กองช่าง	✓			ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 97.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 582.00 ตารางเมตร แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
3	ปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก และแอสฟัลต์คอนกรีต เป็นแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนแยมเกษร หมู่ที่ 7	705,000 (งบ อบต.)	705,000 (งบ อบต.)	550,000	ตุลาคม - ธันวาคม 2567	กองช่าง	✓			ดำเนินการรื้อผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมพร้อมก่อสร้างผิวจราจร แอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 - 6.70 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 83.80 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 2.80 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 161.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 866.10 ตารางเมตร แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2567  	-

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนา	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
4	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนโสรธร ซอย 3 หมู่ที่ 2	215,800 (งบ อบต.)	215,800 (งบ อบต.)	207,000	ตุลาคม 2567	กองช่าง	✓			ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างท่อระบาย น้ำ ถนนโสรธร ซอย 3 หมู่ที่ 2 โดยช่วง ที่ 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรรวมบ่อพักและรางวิกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 20.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ รวมกันไม่น้อยกว่า 82.00 ตาราง เมตร และท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กผิวจราจรกว้าง 3.80 เมตร ระยะทางยาว 19.80 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 75.24 ตารางเมตร แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2567	-
รวม		6,088,879.53	6,088,879.53	5,796,692.53							
รวมแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา		6,088,879.53	6,088,879.53	5,796,692.53							

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้างสาธารณูปโภค เชื่อมโยงเขตพื้นที่เศรษฐกิจ และรองรับการขยายตัวของเมือง

1.1.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ขุดลอกคลองบางกุ้ง หมู่ที่ 1,4,5	395,000 (งบ อบต.)	395,000 (งบ อบต.)	395,000	ตุลาคม - พฤศจิกายน 2567	กองช่าง	✓			ดำเนินการจ้างเหมาขุดลอกคลองบางกุ้ง หมู่ที่ 1,4,5 สภาพเดิมปากคลอง กว้าง 10.00 เมตร ก้นคลองเดิม กว้าง 7.00 เมตร ขุดจากสภาพเดิม ปากคลอง กว้าง 3.00 เมตร ก้นคลอง กว้าง 2.00 เมตร ลึก 1.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 2,980.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า 7,450.00 ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2567	-
รวม		395,000	395,000	395,000							
รวมแผนงานการเกษตร		395,000	395,000	395,000							



**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
กรณีที่ยังไม่ได้ก่อนหน้านี้ผูกพันไว้ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567)**



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้างสาธารณูปโภค เชื่อมโยงเขตพื้นที่เศรษฐกิจ และรองรับการขยายตัวของเมือง

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโสร้อย ซอย 2 หมู่ที่ 2,3	5,080,000 (งบ อบต.)	5,080,000 (งบ อบต.)	-	มีนาคม - กรกฎาคม 2568	กองช่าง			✓	-	เนื่องจาก โครงการ มีจำนวนมาก บุคลากร เฉพาะด้าน มีจำกัด ทำให้ ดำเนินการ ไม่ทัน
2	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนโสร้อยวงแหวน ซอย 1/1 หมู่ที่ 4	3,275,000 (งบ อบต.)	3,275,000 (งบ อบต.)	-	ธันวาคม 2567 - มีนาคม 2568	กองช่าง			✓	-	เนื่องจาก โครงการ มีจำนวนมาก บุคลากร เฉพาะด้าน มีจำกัด ทำให้ ดำเนินการ ไม่ทัน
รวม		8,355,000	8,355,000	-							
รวมแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา		8,355,000	8,355,000	-							

**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566–2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
งบประมาณเงินสะสม**



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้างสาธารณูปโภค เชื่อมโยงเขตพื้นที่เศรษฐกิจ และรองรับการขยายตัวของเมือง

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนฉะเชิงเทรา – บางปะกง ซอย 24/2 หมู่ที่ 1	955,000 (เงินสะสม)	955,000 (เงินสะสม)	810,000	มีนาคม – มิถุนายน 2568	กองช่าง	✓			ดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก รวมบ่อพักและรางวิ กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง ยาว 101.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่ น้อยกว่า 606.00 ตารางเมตร และ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 0.40 เมตร, 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักท่อระบายน้ำ 0.40 เมตร	-
											

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
2	ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต เป็นผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรีเจริญ ซอย 5,6 หมู่ที่ 6	2,784,000 (เงินสะสม)	2,784,000 (เงินสะสม)	2,500,000	มีนาคม – มิถุนายน 2568	กองช่าง	✓			ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร โดยรื้อ ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อม ก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมบ่อพักและรางวิ กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 459.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,754.00 ตารางเมตร แล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568	-



ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
3	ปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต ถนนโสรจรเจริญ (จากสะพานคลองใหม่ ศรีเจริญ – สามแยก หลอดท่ากก) หมู่ที่ 6	1,480,000 (เงินสะสม)	1,480,000 (เงินสะสม)	1,367,299	มีนาคม – มิถุนายน 2568	กองช่าง	✓			ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร โดยการ รื้อผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีตเดิม พร้อมก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต กว้าง 5.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 460.00 เมตร หรือ มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,530.00 ตารางเมตร แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568	-
											

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
4	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมก่อสร้าง ท่อระบายน้ำถนน บุญมนต์ชัย (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 1	1,760,000 (เงินสะสม)	1,760,000 (เงินสะสม)	-	กรกฎาคม - กันยายน 2568	กองช่าง			✓	-	เนื่องจาก โครงการ มีจำนวนมาก บุคลากร เฉพาะด้าน มีจำกัด ทำให้ ดำเนินการ ไม่ทัน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
5	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมเสริม ปากบ่อพักท่อระบายน้ำ ถนนโสรวงแหวน ซอย 3 หมู่ที่ 1	230,000 (เงินสะสม)	230,000 (เงินสะสม)	-	มีนาคม - มิถุนายน 2568	กองช่าง			✓	-	เนื่องจาก โครงการ มีจำนวนมาก บุคลากร เฉพาะด้าน มีจำกัด ทำให้ ดำเนินการ ไม่ทัน
6	ปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อม ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนศรีเจริญ ซอย 5,6 (บ้านแถว) หมู่ที่ 6	1,060,000 (เงินสะสม)	1,060,000 (เงินสะสม)	-	กรกฎาคม - กันยายน 2568	กองช่าง			✓	-	เนื่องจาก โครงการ มีจำนวนมาก บุคลากร เฉพาะด้าน มีจำกัด ทำให้ ดำเนินการ ไม่ทัน

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
7	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแย้มเกษร ซอย 2/2 หมู่ที่ 7	189,000 (เงินสะสม)	189,000 (เงินสะสม)	-	มีนาคม - มิถุนายน 2568	กองช่าง			✓	-	ปัจจุบัน ยุติการ การก่อสร้าง เนื่องจากติด ปัญหาด้าน กรรมสิทธิ์ที่ดิน
8	ปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้าง ท่อระบายน้ำ ถนนเทพคุณากร ซอย 17 หมู่ที่ 7	380,000 (เงินสะสม)	380,000 (เงินสะสม)	-	กรกฎาคม - กันยายน 2568	กองช่าง			✓	-	หาผู้รับจ้างไม่ได้ เนื่องจาก งบประมาณ น้อย การเข้าถึง หน่วยงานลำบาก
รวม		8,838,000	4,160,701	4,677,299							
รวมแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา		8,838,000	4,160,701	4,677,299							

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

1.1 กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง โครงสร้างสาธารณูปโภค เชื่อมโยงเขตพื้นที่เศรษฐกิจ และรองรับการขยายตัวของเมือง

1.1.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาฯ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ใน ข้อบัญญัติฯ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	กรอบของ แผนการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	การบรรลุเป้าหมาย			ผลการดำเนินงาน/ วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	จัดซื้อที่ดิน	24,000,000 (เงินสะสม)	21,220,000 (เงินสะสม)	-	ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568	สำนักปลัด			✓	-	- ความซับซ้อนของกฎหมายและระเบียบ - ราคาที่ดินประเมินไม่สอดคล้องกับตลาด - การดำเนินการตามขั้นตอนที่ยุ่งยากและใช้เวลานาน - คณะกรรมการกำหนดราคากลางการจัดซื้อที่ดิน มีการโอนย้าย, เกษียณอายุราชการ, ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่ดิน ฯลฯ
รวม		24,000,000	21,220,000	-							
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป		24,000,000	21,220,000	-							
